


Facturación centralizada

Gestión centralizada de contratos, pedidos, entregas y facturas

Presto está diseñado para trabajar orientado a proyectos individuales, de forma que cada archivo equivale normalmente a una obra. Sin embargo, se pueden gestionar de forma centralizada los documentos administrativos de varias obras creando una obra central como se describe en la nota técnica "Consulta integrada de presupuestos".

- Los documentos generales de la empresa o que afectan a varias obras deben introducirse en la obra central.
- Los documentos específicos de una obra se pueden introducir en la central o en la propia obra.

Los documentos de cada obra se llevan a la central cuando lo desee con la opción "Actualizar documentos". Se importan también los textos y los archivos asociados de los contratos adjudicados y los demás documentos. Si no desea perder posibles cambios introducidos en la central para los documentos recibidos con anterioridad, puede importar sólo los que no existan previamente.

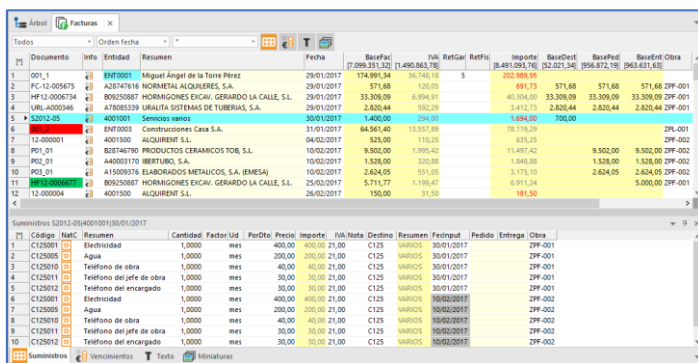

Documento	Info	Entidad	Resumen	Fecha	BaseFac	IVA	RetGral	RatFac	Importe	BaseDest	BaseFisc	BaseEnt	BaseEnt Obra
001_1		ENT0001	Miguel Ángel de la Torre Pérez	29/01/2017	174,991,34	36,748,18	0		202,389,95				
FC-12-005675		A23747616	HORMETA ALCAZARRES, S.A.	29/01/2017	571,68	120,05			691,73	571,68	571,68	571,68	ZPF-001
HF-12-000674		B0025987	HORMIGONES EXCAV. GERARDO LA CALLE, S.L.	29/01/2017	33.309,09	6.994,91			40.304,00	33.309,09	33.309,09	33.309,09	ZPF-001
URL-4000346		A7605339	URULITA SISTEMAS DE TUBERIAS, S.A.	29/01/2017	2.820,44	592,28			3.412,73	2.820,44	2.820,44	2.820,44	ZPF-001
S2012-05		4001001	Servicios varios	30/01/2017	1.400,00	294,00			1.694,00		700,00		
12-000001		ENT0003	Construcciones Casa S.A.	31/01/2017	64.941,40	13.533,08			78.174,28				ZPF-001
12-000001		4001500	ALQUIRENT S.L.	04/02/2017	523,00	110,25			633,25				ZPF-002
PO1_01		B33746790	PRODUCTOS CERAMICOS TOB, S.L.	10/02/2017	9.502,00	1.995,42			11.497,42	9.502,00	9.502,00	9.502,00	ZPF-002
PO1_01		A40001170	BETURBO, S.A.	10/02/2017	1.528,00	320,88			1.848,88	1.528,00	1.528,00	1.528,00	ZPF-002
PO1_01		A15009376	ELABORADOS METALICOS, S.A. (EMESA)	10/02/2017	2.624,05	551,05			3.175,10	2.624,05	2.624,05	2.624,05	ZPF-002
HF-12-000675		B0025987	HORMIGONES EXCAV. GERARDO LA CALLE, S.L.	25/02/2017	5.711,77	1.199,47			6.911,24			5.000,00	ZPF-001
12-000004		4001500	ALQUIRENT S.L.	26/02/2017	190,00	31,50			221,50				

Obra central con facturas de diferentes obras

Puede exportar los documentos de la central a cada obra para su consulta o tratamiento local, ya sea sólo los no exportados previamente o todos; en este caso se borrarán previamente los existentes.

Las obras enlazadas tienen que estar accesibles sólo cuando se realizan operaciones de exportación en uno u otro sentido.

Utilización

Para aprovechar correctamente la centralización la codificación de conceptos debe ser uniforme o coherente entre todas las obras, aunque en cada obra cada concepto puede tener un precio diferente e incluso puede haber diferencias entre los resúmenes y los textos.

Los contratos, por el contrario, son específicos de cada obra, por lo que es recomendable que tengan un código distinto en cada una. Para ver la obra de la que provienen añada al esquema donde están los contratos la columna "Código2".

Se considera que los pedidos y entregas de las distintas obras son el mismo si tienen el mismo código de documento, proveedor y fecha, así como las facturas, en este caso, que sean del mismo año.

Asignación a la obra

Los documentos, suministros, vencimientos y proveedores se gestionan y consultan de la misma manera que en las obras aisladas, excepto la asignación de cada documento o suministro a una obra específica.

Para asignar un documento a una obra utilice el campo "Obra", añadiéndolo al esquema deseado, si no aparece. La casilla de sugerir muestra las obras dadas de alta en la central. Si los suministros son para obras diferentes puede indicarlo en cada uno de ellos, desdoblado las cantidades de un mismo suministro, si es necesario.

En los suministros figura la obra enlazada en el campo "Obra". En los documentos se rellena también si todos sus suministros pertenecen a la misma.

Costes reales

El análisis de costes reales se realiza en cada obra independiente, aunque se basa en información generada en la obra central, como los precios reales de los suministros.

Si desea introducir el destino de cada consumo en su propia obra, en lugar de la obra central, los documentos se pueden intercambiar entre ambas con las opciones "Sólo leer imputaciones" y "Con borrado previo, respetando imputaciones", que leen sólo el destino de cada suministro sin alterar ninguna otra información de los documentos.

Resultados por obras

Los datos de los suministros y proveedores de cada obra se muestran en las ventanas de presupuesto, ventana subordinada "Precios de una obra", en los esquemas correspondientes al tipo de información deseado.

Informes del grupo "10 Multiobra"

Los informes filtran por fechas, proveedores, etc., para obtener resultados más útiles.

Compras, obras y proveedores

Suministros comprados, desglosados por obra y proveedor.

Obras y centros de coste

Obras, con sus centros de coste e imputaciones recibidas.

Obras, proveedores y compras

Obras con sus proveedores y los suministros comprados a cada uno.

Casos prácticos

Detallamos dos casos distintos de uso, aunque el sistema de facturación centralizada permite múltiples variantes que pueden adaptarse a las necesidades particulares de los usuarios.

- En el primero, vamos a suponer que los documentos, como entregas y facturas, llegan a las oficinas centrales de la empresa y se anotan en una obra central. Las imputaciones de los suministros a sus centros de coste se realizan en las obras independientes, por lo que enviaremos esos documentos a las obras para anotar los destinos de los suministros.
- En el segundo caso, los albaranes de compra o entregas llegan a cada una de las obras en ejecución, por lo que se anotan en las obras asociadas. Posteriormente se envían a la central para continuar con el proceso de gestión financiera.

Introducción de documentos en la central e imputación de costes en las obras

Partimos de una obra central a la que asociamos una o varias obras mediante la opción "Procesos: Multiobra: Enlazar".

A continuación, anotamos las facturas con sus suministros.

The screenshot shows the 'Árbol' view of the system. The top part displays a tree structure with a selected node '1 Obra' (Madrid). Below this, the 'Facturas' table is visible, listing invoices with columns for document number, entity, date, and amounts. Below the invoices, the 'Suministros' table shows the breakdown of items from the selected invoice, including codes, descriptions, quantities, and prices.

Documento	Info	Entidad	Resumen	Fecha	BaseFac	IVA	RetGar	RetFis	Importe	BaseDest	BasePed	BaseEnt
1	F01/2020	A28747616	NORMETAL ALQUILERES, S.A.	23/06/2020	3.325,00	698,25			4.023,25			
2	F02/2020	B09250887	HORMIGONES EXCAV. GERARDO LA CALLE, S.L.	24/06/2020	50.019,94	10.504,19			60.524,13			
3	F03/2020	A78085339	URALITA SISTEMAS DE TUBERIAS, S.A.	06/07/2020	6.214,43	1.305,03			7.519,46			
4	F04/2020	A78892387	IBERHORMIGONES, S.A.	16/07/2020	56.120,74	11.785,36			67.906,10			

[*] Código	NatC	Resumen	Cantidad	Factor	Ud	PorDto	Precio	Importe	IVA	Nota	Pedido	Entrega	Obra
1	E02ES020	Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos duros, a mano	100,0000		m3		41,72	4.172,00	21,00				
2	E02CM030	Excavación en terrenos compactos a máquina	2,300,0000		m3		1,63	3.749,00	21,00				
3	E02TT040	Transporte de tierras al vertedero, d < 20 km, carga a máquina	3,100,0000		m3		10,57	32.767,00	21,00				
4	E02RV020	Refinado de vaciados, en terrenos duros, a mano	320,0000		m2		3,77	1.206,40	21,00				
5	E02RP020	Refinado de zanjas, pozos y bataches, en terrenos duros, a mano	888,0000		m2		3,88	3.445,44	21,00				
6	E02QB050	Excavación en bataches, en terrenos duros, a máquina	190,0000		m3		10,54	2.002,60	21,00				
7	E02PM030	Excavación en pozos en terrenos compactos, a máquina	250,0000		m3		10,71	2.677,50	21,00				

Ventana "Árbol", abierta por el esquema "Integración de obras" y "Facturas"

El siguiente paso es anotar en el campo "Obra" de los suministros de la factura con el código de la obra a la que pertenecen. Para ello puede utilizarse el botón "Sugerir" del campo "Obra".

Si todos los suministros de una factura corresponden a la misma obra, puede anotar su código en el campo "Obra" de la ventana "Facturas".

En el caso de que un mismo suministro corresponda a más de una obra, se puede desdoblar para anotar qué parte pertenece a cada obra.

[Y]	Documento	Info	Entidad	Resumen	Fecha	BaseFac	IVA	RetGar	RetFis	Importe	BaseDest	BasePed	BaseEnt	Obra
1	F01/2020		A28747616	NORMETAL ALQUILERES, S.A.	23/06/2020	3.325,00	698,25			4.023,25				
2	F02/2020		B09250887	HORMIGONES EXCAV. GERARDO LA CALLE, S.L.	24/06/2020	50.019,94	10.504,19			60.524,13				Obra
3	F03/2020		A78085339	URALITA SISTEMAS DE TUBERIAS, S.A.	06/07/2020	6.214,43	1.305,03			7.519,46				
4	F04/2020		A78892387	IBERHORMIGONES, S.A.	16/07/2020	56.120,74	11.785,36			67.906,10				

[*]	Código	NatC	Resumen	Cantidad	Factor Ud	PorDto	Precio	Importe	IVA	Nota	Pedido	Entrega	Obra
1	E02ES020		Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos duros, a mano	100,0000	m3		41,72	4.172,00	21,00				Obra
2	E02CM030		Excavación en terrenos compactos a máquina	2.300,0000	m3		1,63	3.749,00	21,00				Obra
3	E02TT040		Transporte de tierras al vertedero, d < 20 km, carga a máquina	3.100,0000	m3		10,57	32.767,00	21,00				Obra
4	E02RV020		Refinado de vaciados, en terrenos duros, a mano	320,0000	m2		3,77	1.206,40	21,00				Obra
5	E02RP020		Refinado de zanjas, pozos y bataches, en terrenos duros, a mano	888,0000	m2		3,88	3.445,44	21,00				Obra
6	E02QB050		Excavación en bataches, en terrenos duros, a máquina	190,0000	m3		10,54	2.002,60	21,00				Obra
7	E02PM030		Excavación en pozos en terrenos compactos, a máquina	250,0000	m3		10,71	2.677,50	21,00				Obra

Ventanas "Facturas" y subordinada "Suministros" con el campo "Obra" relleno

Ejecutamos la opción "Procesos: Multiobra: Exportar documentos" seleccionando "Con borrado previo".

Exportar documentos ✕

Obras

Con máscara

Seleccionados

Documentos:

Caja de diálogo "Exportar documentos"

Abrimos la obra asociada y rellenos el campo "Destino" de los suministros de las facturas con el código de los centros de coste a los que se van a imputar.

[Y]	Documento	Info	Entidad	Resumen	Fecha	BaseFac	IVA	RetGar	RetFis	Importe	BaseDest	BasePed	BaseEnt	Obra
1	F01/2020		A28747616	NORMETAL ALQUILERES, S.A.	23/06/2020	3.325,00	698,25			4.023,25	3.325,00			
2	F02/2020		B09250887	HORMIGONES EXCAV. GERARDO LA CALLE, S.L.	24/06/2020	50.019,94	10.504,19			60.524,13	50.019,94			
3	F03/2020		A78085339	URALITA SISTEMAS DE TUBERIAS, S.A.	06/07/2020	6.214,43	1.305,03			7.519,46	6.214,43			
4	F04/2020		A78892387	IBERHORMIGONES, S.A.	16/07/2020	56.120,74	11.785,36			67.906,10	56.120,74			

[*]	Código	NatC	Resumen	Cantidad	Factor Ud	PorDto	Precio	Importe	IVA	Nota	Destino	Resumen	Fechnput
1	E02ES020		Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos duros, a mano	100,0000	m3		41,72	4.172,00	21,00	E02	ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO		24/06/2020
2	E02CM030		Excavación en terrenos compactos a máquina	2.300,0000	m3		1,63	3.749,00	21,00	E02	ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO		24/06/2020
3	E02TT040		Transporte de tierras al vertedero, d < 20 km, carga a máquina	3.100,0000	m3		10,57	32.767,00	21,00	E02	ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO		24/06/2020
4	E02RV020		Refinado de vaciados, en terrenos duros, a mano	320,0000	m2		3,77	1.206,40	21,00	E02	ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO		24/06/2020
5	E02RP020		Refinado de zanjas, pozos y bataches, en terrenos duros, a mano	888,0000	m2		3,88	3.445,44	21,00	E02	ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO		24/06/2020
6	E02QB050		Excavación en bataches, en terrenos duros, a máquina	190,0000	m3		10,54	2.002,60	21,00	E02	ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO		24/06/2020
7	E02PM030		Excavación en pozos en terrenos compactos, a máquina	250,0000	m3		10,71	2.677,50	21,00	E02	ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO		24/06/2020

Facturas y suministros imputados

Por último, rellenos las cantidades producidas (columna "Relaciones.CanReal") y recalculamos la obra.

Podemos consultar los resultados obtenidos en el esquema "Control de costes" de las ventanas "Árbol" o "Presupuesto".

Código	Nat	TipoCaste	TipoConsumo	Resumen	CanObj	CanReal	CanInput,Ud	RealObj	Real	ImpRealObj	ImpReal	ImpInput
1/0	0	Raíz	Destino	Por imputación Obra asociada a central	1	1	1	2.121.943,56	2.121.933,99	2.121.943,56	2.121.933,99	115.680,11
2/1	-1	E01	Capítulo	Destino Por imputación ACTUACIONES PREVIAS	1	1	1	3.492,97	3.383,40	3.492,97	3.383,40	3.325,00
3/2	+1.1	E01AE010	Partida	Suministro Par imputación Entibación simple en zarzias con madera, h < 3 m	127,04	127,04	125,00 m2	9,59	9,00	1.218,31	1.143,36	1.125,00
4/2	+1.2	E01AE070	Partida	Suministro Par imputación Entibación simple en zapatas o pozos con madera, h < 3 m	203,64	203,64	200,00 m2	11,17	11,00	2.274,66	2.240,04	2.200,00
5/1	-2	E02	Capítulo	Destino Por imputación ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO	1	1	1	50.802,38	50.802,38	50.802,38	50.802,38	50.019,94
6/2	+2.1	E02CM030	Partida	Suministro Par imputación Excavación en terrenos compactos a máquina	2.376,31	2.376,31	2.300,00 m3	1,63	1,63	3.873,39	3.873,39	3.749,00
7/2	+2.2	E02RV020	Partida	Suministro Par imputación Refinado de vaciados, en terrenos duros, a mano	324,00	324,00	320,00 m2	3,77	3,77	1.221,48	1.221,48	1.206,40
8/2	+2.3	E02OB050	Partida	Suministro Par imputación Excavación en bataches, en terrenos duros, a máquina	190,00	190,00	190,00 m3	10,54	10,54	2.002,60	2.002,60	2.002,60
9/2	+2.4	E02PM030	Partida	Suministro Par imputación Excavación en pozos en terrenos compactos, a máquina	253,79	253,79	250,00 m3	10,71	10,71	2.718,09	2.718,09	2.677,50
10/2	+2.5	E02RP020	Partida	Suministro Par imputación Refinado de zarzias, pozos y bataches, en terrenos duros, a mano	888,30	888,30	888,00 m2	3,88	3,88	3.446,60	3.446,60	3.445,44
11/2	+2.6	E02ES020	Partida	Suministro Par imputación Excavación en zarzias de saneamiento, en terrenos duros, a mano	106,05	106,05	100,00 m3	41,72	41,72	4.424,41	4.424,41	4.172,00
12/2	+2.7	E02T040	Partida	Suministro Par imputación Transporte de tierras al vertedero, d < 20 km, carga a máquina	3.133,00	3.133,00	3.100,00 m3	10,57	10,57	33.115,81	33.115,81	32.767,00
13/1	-3	E03	Capítulo	Destino Por imputación RED DE SANEAMIENTO	1	1	1	6.197,14	6.197,14	6.197,14	6.197,14	6.214,43
14/2	+3.1	E03AL010	Partida	Suministro Par imputación Arqueta a pie de bajante registrable de ladrillo, con tapa, de 38x38x50 cm	15,00	15,00	15,00 ud	78,36	78,36	1.175,40	1.175,40	1.175,40
15/2	+3.2	E03EP130	Partida	Suministro Par imputación Colector de PVC compacta, teja, 4 kN/m2, D=160 mm	81,16	81,16	82,00 m	16,49	16,49	1.338,33	1.338,33	1.352,18
16/2	+3.3	E03EP140	Partida	Suministro Par imputación Colector de PVC compacta, teja, 4 kN/m2, D=200 mm	32,46	32,46	33,00 m	22,05	22,05	715,74	715,74	727,65
17/2	+3.4	E03DM020	Partida	Suministro Par imputación Membrana drenante de polietileno de alta densidad H-15*, vertical	722,06	722,06	720,00 m2	4,11	4,11	2.967,67	2.967,67	2.959,20
18/1	-4	E04	Capítulo	Destino Por imputación CIMENTACIONES	1	1	1	56.186,84	56.186,84	56.186,84	56.186,84	56.120,74
19/2	+4.1	E04CM040	Partida	Suministro Par imputación Hormigón de limpieza HM-20/P/20/I, vertido manual	34,55	34,55	35,00 m3	53,63	53,63	1.852,92	1.852,92	1.877,05
20/2	+4.2	E04CA060	Partida	Suministro Par imputación Hormigón armado HA-25/P/40/Ia, en zapatas, vertido con grúa	220,91	220,91	221,00 m3	105,65	105,65	23.339,14	23.339,14	23.348,65
21/2	+4.3	E04SE020	Partida	Suministro Par imputación Enchada de piedra caliza 40/80, e=20 cm	680,00	680,00	680,00 m2	5,99	5,99	3.897,40	3.897,40	3.887,40
22/2	+4.4	E04SA020	Partida	Suministro Par imputación Solera de hormigón HA-25 armado con mallazo, e=15 cm	680,00	680,00	680,00 m2	12,01	12,01	7.926,60	7.926,60	7.926,60
23/2	+4.5	E04MA010	Partida	Suministro Par imputación Hormigón armado HA-25/P/20/I, en muro de 25 cm, 1 cara, vertido manual	88,46	88,46	88,00 m3	216,63	216,63	19.180,78	19.180,78	19.081,04

Ventana "Árbol" esquema "Control de costes"

Anotación de entregas en las obras y control financiero en la central

Suponemos que los albaranes de entrega se anotan en la obra a la que corresponden los suministros. La obra debe enlazarse en la central mediante el procedimiento descrito anteriormente.


Damos de alta las entregas y sus suministros en la obra.

[Y]	Documento	Info	Entidad	Resumen	Fecha	BaseEnt	BaseDest	BasePed	BaseFac	Obra	Nota
1	EP01		B28746790	PRODUCTOS CERAMICOS TOB, S.L.	24/01/2017	170.773,56	170.773,56				
2	EP02		A40003170	IBERTUBO, S.A.	02/02/2017	2.020,40	2.020,40				
3	EP03		A15009376	ELABORADOS METALICOS, S.A. (EMESA)	03/02/2017	128.024,05	128.024,05				
4	M_01		ENT0003	Construcciones Casa S.A.	10/02/2017	28.829,12	28.829,12				
5	O01_01		ENT0003	Construcciones Casa S.A.	10/02/2017	23.719,26					
6	P2012-05		4001200	Mano de obra de la empresa	10/02/2017	4.400,00	4.400,00				
7	EP06		A28022168	NUEVOS MAT. DE CONSTRUCCION,S.A.(NUMACO)	22/02/2017	6.850,00	6.850,00				
8	P2012-06		4001200	Mano de obra de la empresa	10/03/2017	7.000,00	7.000,00				
9	M_02		ENT0003	Construcciones Casa S.A.	11/03/2017	18.374,35	18.374,35				
10	O01_02		ENT0003	Construcciones Casa S.A.	11/03/2017	55.450,50					
11	M2012-07		4001300	Maquinaria de la empresa	11/04/2017	5.000,00	5.000,00				
12	M_03		ENT0003	Construcciones Casa S.A.	11/04/2017	21.802,69	21.802,69				

[*]	Código	NatC	Resumen	Cantidad	Factor	Ud	PorDto	Precio	Importe	Nota	Obra
1	P01AA020		Arena de río 0/6 mm.	54,0000		m3		12,00	648,00		
2	P01EM270		Madera pino para entibaciones	4,0000		m3		123,00	492,00		
3	P01EM290		Madera pino encofrar 26 mm.	1,0000		m3		182,00	182,00		
4	P01HA010		Hormigón HA-25/P/20/I central	152,0000		m3		40,00	6.080,00		
5	P01HM010		Hormigón HM-20/P/20/I central	35,0000		m3		47,00	1.645,00		
6	P01HM020		Hormigón HM-20/P/40/I central	5,0000		m3		47,00	235,00		
7	P01LT020		Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.	2,0000		mud		49,00	98,00		
8	P01MC040		Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM	1,0000		m3		42,00	42,00		
9	P01UC030		Puntas 20x100	16,0000		kg		5,00	80,00		
10	P01HA010		Hormigón HA-25/P/20/I central	626,0000		m3		40,00	25.040,00		
11	P01DW090		Pequeño material	162,0000		ud		1,00	162,00		

Ventana "Entregas" y subordinada "Suministros"

A continuación, en la central ejecutamos la opción "Procesos: Multiobra: Actualizar documentos", seleccionando "Con borrado previo".

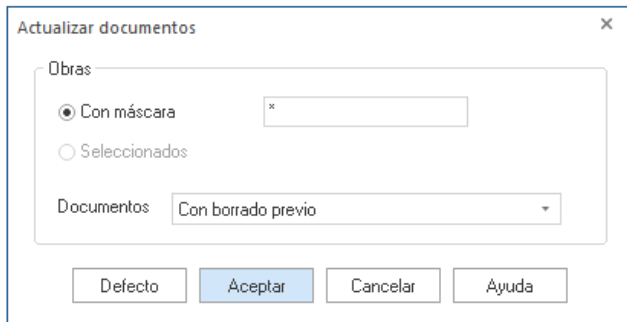

Caja de diálogo "Actualizar documentos"

Comprobamos que en la ventana "Entregas" de la central se han importado todas las entregas de la obra asociada. Tanto el campo "Obra" de la ventana principal como de la subordinada "Suministros" se ha rellenado con el código de la obra que contenía las entregas.

[Y]	Documento	Info	Entidad	Resumen	Fecha	BaseEnt	BaseDest	BasePed	BaseFac	Obra	Nota
1	EP01		B28746790	PRODUCTOS CERAMICOS TOB, S.L.	24/01/2017	170.773,56	[1.395.747,71]	[139.352,41]	[]	[]	
2	EP02		A40003170	IBERTUBO, S.A.	02/02/2017	2.020,40					
3	EP03		A15009376	ELABORADOS METALICOS, S.A. (EMESA)	03/02/2017	128.024,05					
4	M_01		ENT0003	Construcciones Casa S.A.	10/02/2017	28.829,12	28.829,12				
5	OO1_01		ENT0003	Construcciones Casa S.A.	10/02/2017	23.719,26					
6	P2012-05		4001200	Mano de obra de la empresa	10/02/2017	4.400,00	4.400,00				
7	EP06		A28022168	NUEVOS MAT. DE CONSTRUCCION,S.A.(NUMACO)	22/02/2017	6.850,00					
8	P2012-06		4001200	Mano de obra de la empresa	10/03/2017	7.000,00	7.000,00				
9	M_02		ENT0003	Construcciones Casa S.A.	11/03/2017	18.374,35	18.374,35				
10	OO1_02		ENT0003	Construcciones Casa S.A.	11/03/2017	55.450,50					
11	M2012-07		4001300	Maquinaria de la empresa	11/04/2017	5.000,00	5.000,00				
12	M_03		ENT0003	Construcciones Casa S.A.	11/04/2017	21.802,69	21.802,69				
13	OO1_03		ENT0003	Construcciones Casa S.A.	11/04/2017	36.441,75					

[*]	Código	NatC	Resumen	Cantidad	Factor	Ud	PorDto	Precio	Importe	Nota	Destino	Resumen	Fedinput	Pedido	Factura	Obra
1	P01AA020		Arena de río 0/6 mm.	54,0000		m3		12,00	648,00							Obraconentregas
2	P01EM270		Madera pino para entibaciones	4,0000		m3		123,00	492,00							Obraconentregas
3	P01EM290		Madera pino encofrar 26 mm.	1,0000		m3		182,00	182,00							Obraconentregas
4	P01HA010		Hormigón HA-25/P/20/I central	152,0000		m3		40,00	6.080,00							Obraconentregas
5	P01HM010		Hormigón HM-20/P/20/I central	35,0000		m3		47,00	1.645,00							Obraconentregas
6	P01HM020		Hormigón HM-20/P/40/I central	5,0000		m3		47,00	235,00							Obraconentregas
7	P01LT020		Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.	2,0000		mud		49,00	98,00							Obraconentregas
8	P01MC040		Mortero cem. gris I/B-M 32,5 M-5/CEM	1,0000		m3		42,00	42,00							Obraconentregas
9	P01UC030		Puntas 20x100	16,0000		kg		5,00	80,00							Obraconentregas
10	P01HA010		Hormigón HA-25/P/20/I central	626,0000		m3		40,00	25.040,00							Obraconentregas
11	P01DW090		Pequeño material	162,0000		ud		1,00	162,00							Obraconentregas
12	P01UC030		Puntas 20x100	203,0000		kg		5,00	1.015,00							Obraconentregas
13	P01EM290		Madera pino encofrar 26 mm.	45,0000		m3		182,00	8.190,00							Obraconentregas

Ventana "Entregas"

Por último, se irán anotando las facturas que corresponden a las entregas importadas, lo que permitirá realizar el control financiero en la central de todas las obras asociadas, incluyendo la gestión de vencimientos y el flujo de caja de la empresa.
